

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SOLIS A.E.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ» που εκτελέσθηκαν από τον ανάδοχο «SOLIS A.E.»

Οι υπογράφωντες:




1. **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ** Μηχανολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος, Δ/ση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, Δήμος Λαμιέων
2. **ΑΛΕΞΙΑ ΡΟΥΧΑ** Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Δήμος Λαμιέων
3. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΣΣΛΕΜΕΣ** Δημοτικός Σύμβουλος.


που αποτελούμε με βάση την με αριθμό 24/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΨΜΩΛΚ-ΡΟΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, την επιτροπή οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου, αφού μεταβήκαμε την 28^η του μηνός Μαΐου, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, του δυο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, στο τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την τελική επιμέτρηση που συντάχθηκε από τον ανάδοχο την 14-09-2017, ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τις επιβλέπουσες τις εργασίες ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ την 19-09-2017 και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων κο Δημήτριο Τσώνη Πολιτικό Μηχανικό την 21/09/2017, παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές παρουσία του εκπροσώπου της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης του έργου κ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΙΑΠΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
		Εγκριθείσες 2 ^α ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	Ολογράφως
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ			
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	99,80	99,80	Ενενήντα εννέα κυβικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	417,06	417,06	Τετρακόσια δέκα επτά και έξι εκατοστά
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	635,34	635,34	εξακόσια τριάντα πέντε και τριάντα τέσσερα εκατοστά
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	206,42	206,42	διακόσια έξι και σαράντα δύο εκατοστά
5	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	92,68	92,68	ενενήντα δύο και εξήντα οκτώ εκατοστά
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ			



6	Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m	208	208	διακόσια οκτώ
7	Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπήκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	110	110	εκατόν δέκα
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	150	150	εκατόν πενήντα
9	Χαλύβδινι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.382,62	38.382,62	τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο και εξήντα δύο εκατοστά
10	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	72,38	72,38	εβδομήντα δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ			
11	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm, με αμμοβολή και βαφή	94.202,13	94.202,13	ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια δύο και δέκα τρία εκατοστά
12	Επιστέγαση με πέτασμα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης και περιμετρικά ειδικάτεμάχια	510,36	510,36	πεντακόσια δέκα και τριάντα έξι εκατοστά
	1η Συμπληρωματική Σύμβαση			
13	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ			
14	Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m	148,4	148,4	εκατόν σαράντα οκτώ και τέσσερα δέκατα
15	Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπήκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	99,44	99,44	ενενήντα εννέα και σαράντα τέσσερα εκατοστά
16	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	58,34	58,34	πενήντα οκτώ και τριάντα τέσσερα εκατοστά
17	Χαλύβδινι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	7.325,61	7.325,61	επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε και εξήντα ένα εκατοστά
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ			
18	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm, με αμμοβολή και βαφή	22.518,75	22.518,75	είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά
19	Επικαιροποίηση της Γεωτεχνικής Μελέτης	1	1	ένα




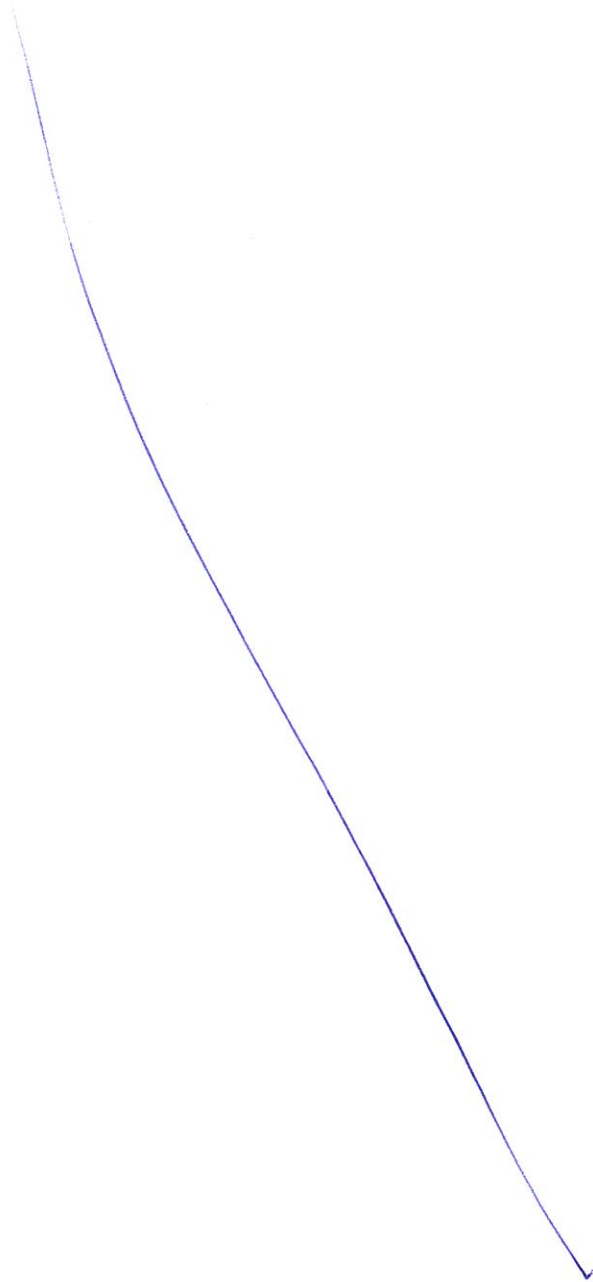





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το έργο εκτελέσθηκε με εργολαβία μετά από δημοπρασία την **22/07/2016** της οποίας το πρακτικό εγκρίθηκε με την αριθ. **387/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό **63118/02-11-2016** Συμφωνητικό, με έκπτωση **38,25%** στις τιμές της με αριθμό **19/2016** μελέτης της ΔΤΕΔΔΕ Λαμιέων.
2. Με αρχική έγκριση **277.893,83€ με ΦΠΑ** (προϋπολογισμού **450.000,00€ με Φ.Π.Α.**) και **93.106,17€** από την 1^η συμπληρωματική σύμβαση, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 238/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δαπανήθηκαν **370.708,51€ με Φ.Π.Α** σύμφωνα με τον 2^ο ΑΠΕ.(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (403/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης 2ου ΑΠΕ).
3. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από πιστώσεις **ΣΑΤΑ**.
4. Με τη παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου σε τμήμα μήκους 32 περίπου μέτρων και πλάτους 16,40 μέτρων, σε μέρος των κερκίδων του Δημοτικού Γηπέδου Λαμίας.
5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:.....
6. Υποβλήθηκε την οριστικό ΦΑΥ – ΣΑΥ μετά το πέρας των εργασιών, με υπεύθυνο – συντονιστή τον **κ. Λιάπη Στέφανο Πολ. Μηχανικό**.
7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
.....
.....
.....
.....
8. Οι εργασίες ποσοτικά παραλαμβάνονται με βάση τη τελική επιμέτρηση του έργου και από τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που τη συνοδεύουν.
9. Από ποιοτικής άποψης διαπιστώνεται ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές, πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής, γι' αυτό παραλαμβάνονται ως καλώς έχουσα.
10. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού που έγιναν κατά την κατασκευή, επεβλήθησαν από τις συνθήκες σαν αναγκαία, για την άρτια εκτέλεση του έργου, γι' αυτό κρίνονται αποδεκτά στο σύνολο όπως έχουν.
11. Οι απολογιστικές από τον ανάδοχο εκτελεσθείσες εργασίες, (για προμήθεια υλικών και εργασίας) δεν υπήρξαν.
12. Η προθεσμία περαίωσης προβλεπόταν **120** ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 02/11/2016 με την υπογραφή της σύμβασης το έργο έπρεπε αρχικά να περαιωθεί μέχρι την 01/03/2017. Με τις αριθ. 161/2017, 302/2017, 363/2017 και 405/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την μέχρι και της 22-09-2017.
9. Η περαίωση των εργασιών έπρεπε να γίνει μέχρι της **12-9-2017** και συντελέστηκε εμπρόθεσμα **12-9-2017**.
- 10.
11. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου, εγκρίθηκε με την αρ. 545/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Λαμιέων
12. Τέλος επειδή σαν χρόνος εγγύησης ορίζεται το **15**μηνο η αποπεράτωση του έργου έγινε στις 12-9-2017 προτείνουμε όπως λόγω του διαρρεύσαντος από την αποπεράτωση χρόνου και του γεγονότος της (σε καλή κατάσταση) διατήρησης του έργου μέχρι σήμερα, η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί σαν οριστική.

Η επιτροπή παραλαβής συνέταξε σε έξι (6) όμοια αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως:
 Λαμία, 28-5-2020

Η Επιτροπή		Για την Ανάδοχο	Οι Επιβλέποντες
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	SOLIS ANONYMH TEXNIKH ETAIRIA "SOLIS A.E." ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 64 - ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 66979 - 2410 61481 Α.Φ.Μ. 999152503 - Α.Δ.ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Μ.Η. 117758540000 Στέφανος Λιάπης	Μηχανικοί Ευθυμία Καραγκούνη Ζωή Κακανά
1. Αγγελική Μακρυγιάννη			
2. Αλεξία Ρουχά			
3. Δημήτριος Μπεσλεμές			

Ε γ κ ρ ι θ η κ ε
 Με την αριθμ. Απόφαση μας
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

